



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MACHIAVELLI – SU PLANU (CIG ZB31ABEEEB - CUP F71E16000160006)

PROGETTISTI		TITOLO DELLA TAVOLA							
Ing. Daniele ASUNIS Dott. Geol. Massimo MELIS		CRONOPROGRAMMA							
COLLABORATORI		SPECIALIZZAZIONE			NUMERO TAV.				
Ing. Alessandro SERPI Geom. Davide STRAZZERA		Architettura	Cantieri		DE_A.7				
		Strutture	Particolari						
		Impianti	Topografia						
		Nome File	Codice Archivio 161659 PR						
		DATA: OTTOBRE 2016							
DIRETTORE TECNICO		EMISSIONI/REVISIONI							
Dott. Ing. Maurizio BOI		Rev.	Zona	Descrizione	Eseg.	Verif.	Approv.	Data	
		0		EMISSIONE	DA	MC	MB	7/10/16	
		1		REVISIONE	DA	MC	MB	24/10/16	
COMMITTENTE Comune di SELARGIUS (RUP Dott. Ing. Enrico SABA)		2							
		3							
		4							
		5							
		5							

TECNOLAV
engineering
srl con socio unico


via La Palma snc 09126 Cagliari
P.Iva 02400800922


T 070.380.044 / 373.721
F 070.773.2441 / 919.0483

tecnolav@tecnolav.it
tecnolav.it



LAVORAZIONI		Distribuzione degli importi relativi agli interventi in progetto (oneri per la sicurezza diffusi compresi)				Totali per singolo intervento
		Giorni	15	30	45	
LAVORI						€ 81.967,21
A	OPERE EDILI	€ 11.368,89	€ 11.368,89	€ 11.368,89	€ 11.368,89	€ 45.475,56
D2	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	€ 4.744,50	€ 4.744,50	€ 4.744,50	€ 4.744,50	€ 18.977,99
D5	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO	€ 3.310,65	€ 3.310,65	€ 3.310,65	€ 3.310,65	€ 13.242,59
	Oneri speciali per la sicurezza SPECIALI	€ 1.067,77	€ 1.067,77	€ 1.067,77	€ 1.067,77	€ 4.271,07
Parziali Mensili		€ 20.491,80	€ 20.491,80	€ 20.491,80	€ 20.491,80	€ 81.967,21
Progressivi		€ 20.491,80	€ 40.983,61	€ 61.475,41	€ 81.967,21	
<i>Giorni</i>		<i>15</i>	<i>30</i>	<i>45</i>	<i>60</i>	

 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MACHIAVELLI – SU PLANU	COMMITTENTE : COMUNE DI SELARGIUS	DE_A.7	Rev. 1
	CRONOPROGRAMMA ANALITICO	DATA: 10/2016	PAG. 2 DI 2

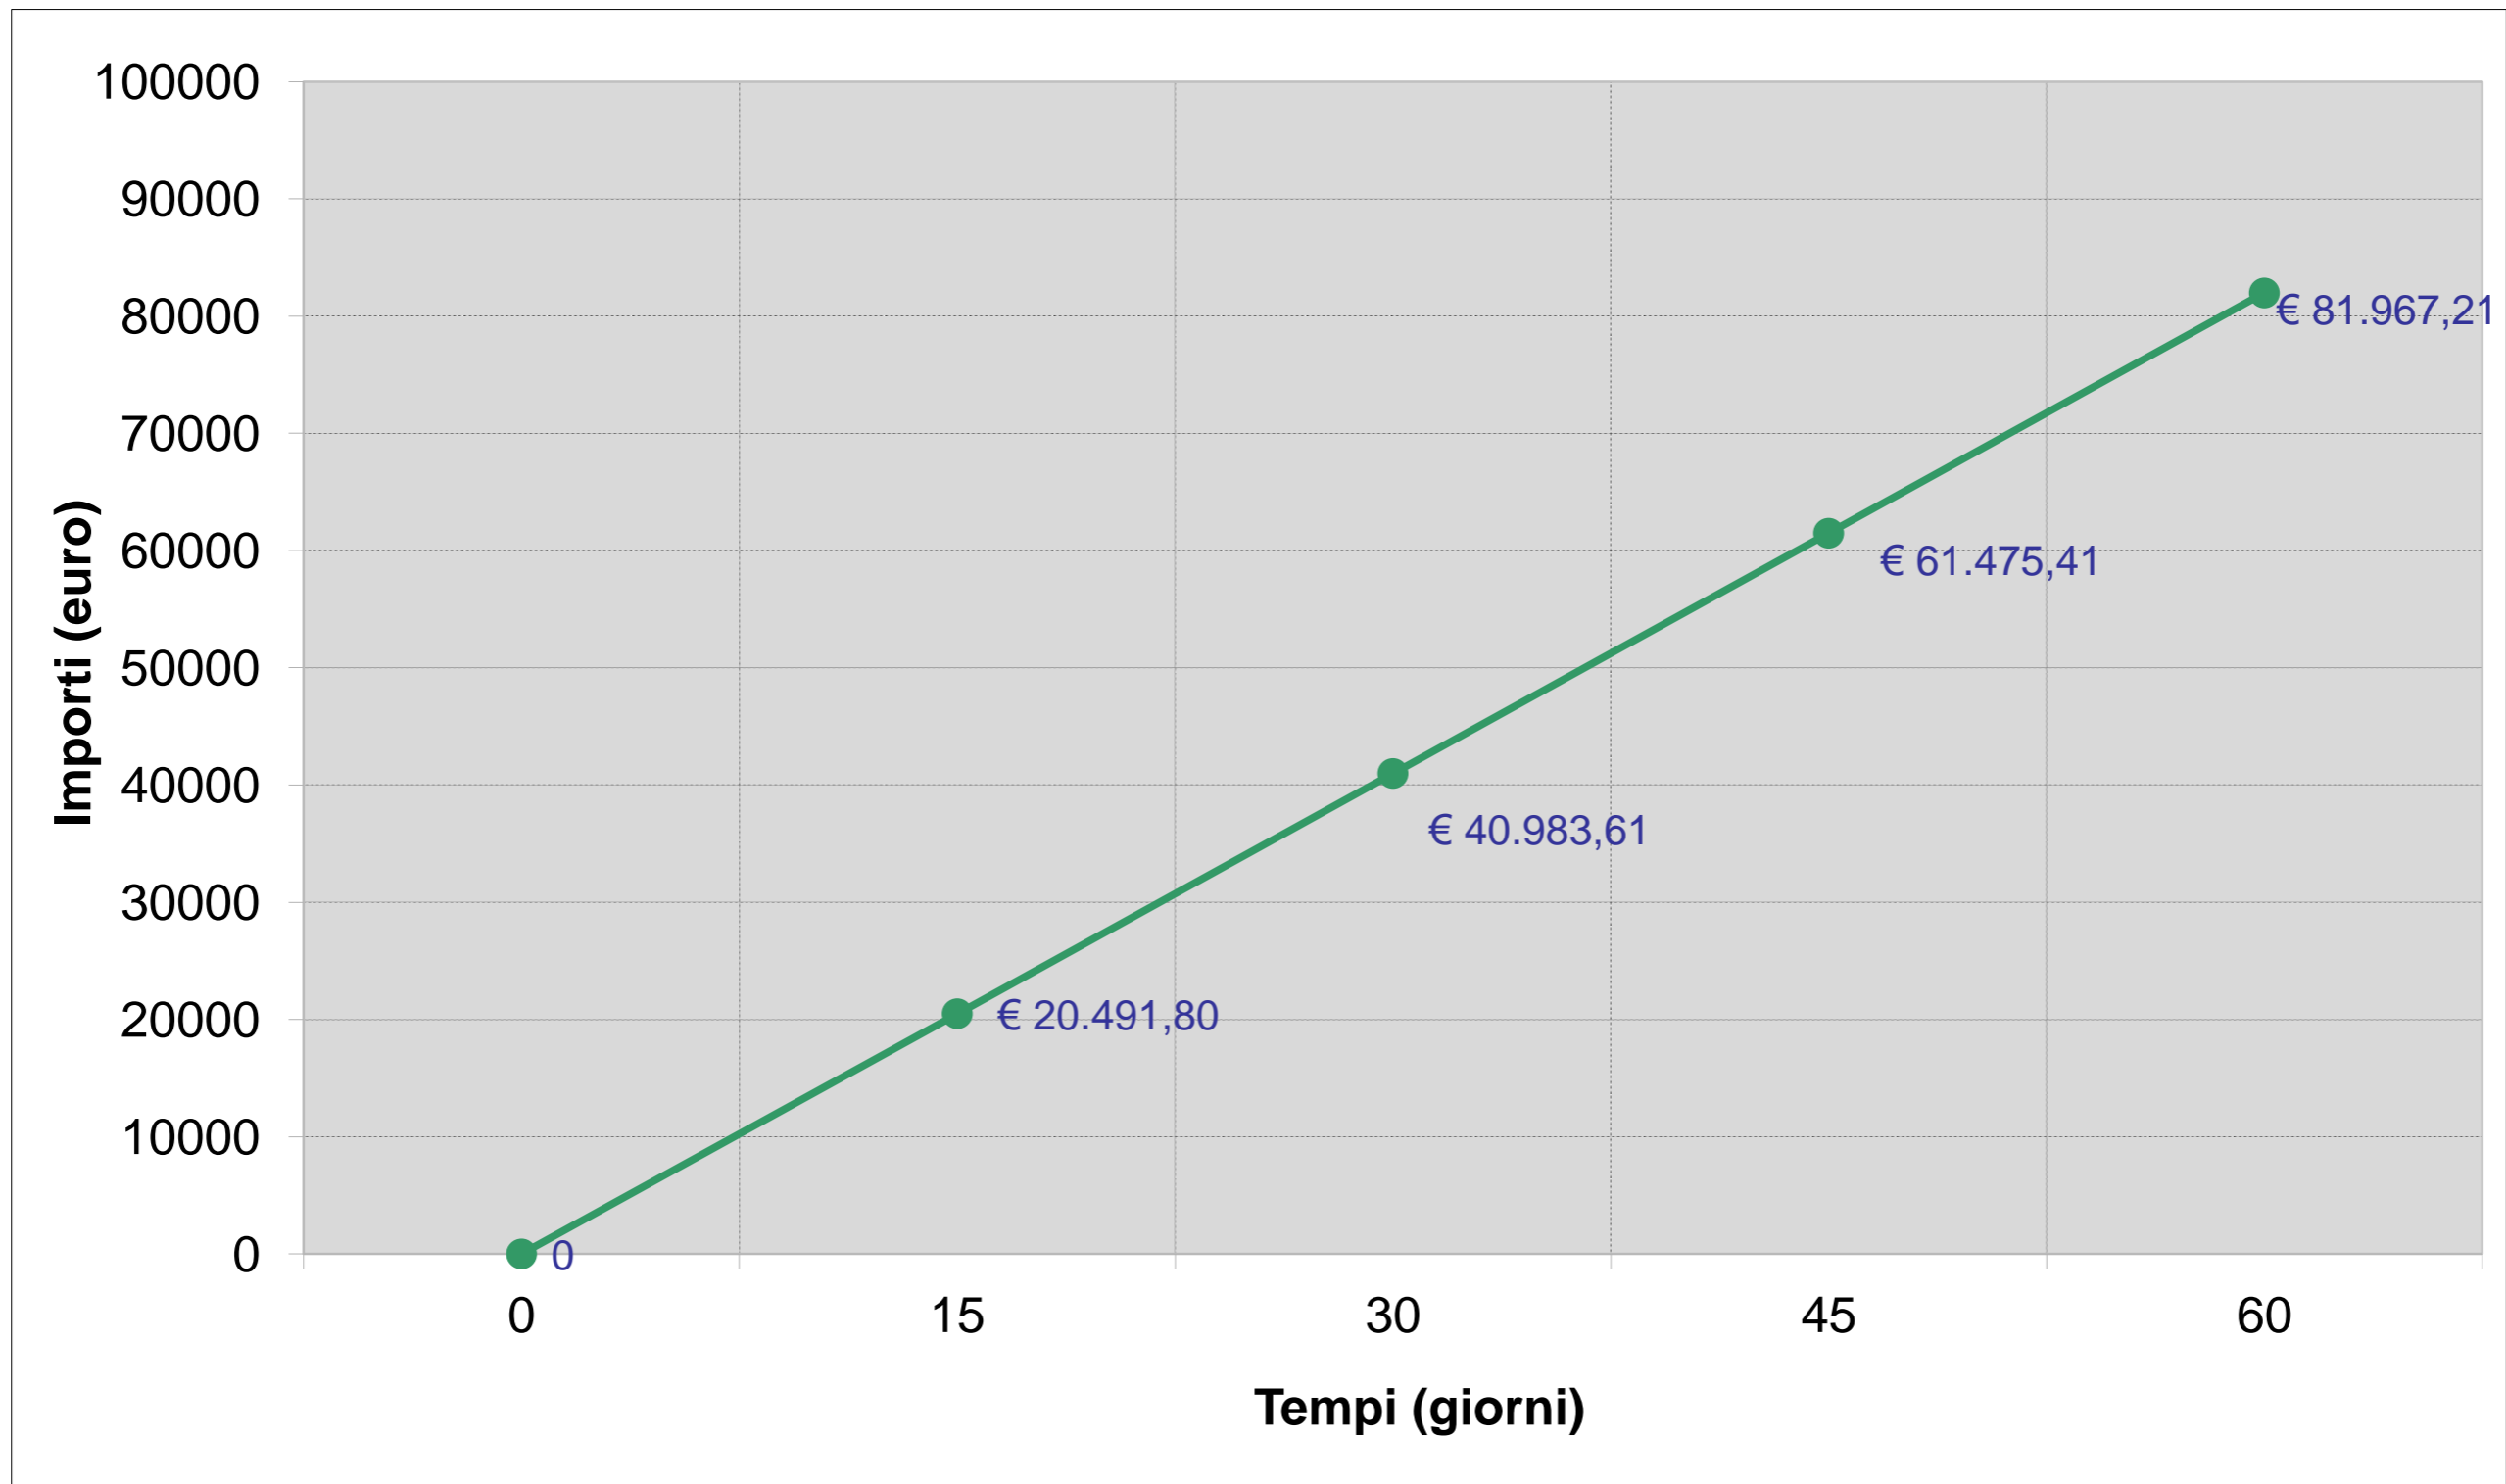

ID	Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3					
			Settimana -1	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	ettimana 1	ettimana 1	ettimana 1	
1	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MACHIAVELLI – SU PLANU	60 g														
2	REALIZZAZIONE DEL CANTIERE GENERALE	5 g														
3	- Sistemazione preliminare dell'area, posa baraccamenti e recinzioni;	3 g														
4	- Realizzazione degli impianti di cantiere, allacciamenti;	2 g														
5	OPERE EDILI – DEMOLIZIONI	18 g														
6	- Rimozione palco, tende	3 g														
7	- Rimozione porte aule piano terra	3 g														
8	- Demolizione delle contro pareti dei locali tecnici al piano terra	1 g														
9	- Invertire il senso di apertura della porta al corridoio uffici del piano terra	4 g														
10	- Demolizione di muratura per posa nuovi infissi nel locale tecnico al piano primo	2 g														
11	- Demolizione degli infissi al piano primo	5 g														
12	OPERE EDILI – NUOVE REALIZZAZIONI	28 g														
13	- Esecuzione di nuovo contromuro locali tecnici piano terra	3 g														
14	- Montaggio nuove porte al piano terra	4 g														
15	- Sostituzione posa nuove finestre piano primo	3 g														
16	- Montaggio paraspigoli nelle finestre al piano primo	1 g														
17	- Realizzazione del nuovo locale quadro al piano primo e spostamento luci e armadio rack	2 g														
18	- Compartimentare le aperture nel solaio di copertura	2 g														
19	- Realizzazioni nuovo parapetto rampa esterna e piano primo e completamento corrimano scale interne	3 g														
20	- Realizzazione palco e tende	4 g														
21	- Esecuzione di prove su strutture esistenti	6 g														
22	OPERE EDILI – IMPIANTI	7 g														
23	- Sostituzione lampade di emergenza piano terra e piano primo, adeguamento cartellonistica del	3 g														
24	- Realizzazione di un sistema di alimentazione di sicurezza per la campanella elettrica	2 g														
25	- Realizzazione di un sistema di alimentazione di sicurezza per la campanella elettrica	2 g														
26	SMOBILIZZO DEL CANTIERE PRINCIPALE	2 g														
27	- Smobilizzo cantiere principale	2 g														

Giorni naturali consecutivi	Attività		Attività riportata		Divisione		Riepilogo raggruppamento	
	Cardine		Cardine riportata		Attività esterne		Avanzamento	
	Riepilogo		Avanzamento riportato		Riepilogo progetto		Scadenza	
